



## PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto  
T – 3

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo  
Dpto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 2 de 15



### Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, dentro de la fuente de financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

Los Proyectos de Viviendas Eco Amigables partiendo de que una vivienda es una estructura tangible, físico-espacial idóneo, donde el ser humano se ha de sentir en un ambiente más seguro, íntimo y afectivo, de manea



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 3 de 15

que nuestro techo es el espacio vital humanizado para la convivencia. Es un espacio de necesidades, valores, entre otros, por lo que su condición y calidad se considera como un importante indicador de bienestar social y derecho humano.

El proyecto de Viviendas Eco Amigables consiste en la Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter ecológico para el hábitat integral de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y en pobreza extrema en diferentes localidades del territorio nacional, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en familias viviendo en condiciones de pobreza extrema a través de un proyecto de construcción de viviendas eco amigables construidas con materiales que no dañan el medio ambiente, favoreciendo a las familias que se encuentran viviendo en condición de pobreza extrema.


- **Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de Barahona, Provincia Barahona – Código SNIP No. I5137.**

Fuente de Financiamiento	Nombre del Proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inversión	Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos En Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de Barahona, Provincia Barahona	I5137	144,208,124.30	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024

**Objetivo del Proyecto:** Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 eco-viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Barahona, Provincia Barahona.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Producto:** Cantidad de Viviendas Construidas.



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A
		Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 4 de 15

### Cronograma Físico del Proyecto

Fase	Producto	Meta	Fecha de Cumplimiento de la Meta
Inversión	Viviendas Construidas	50	2024

#### Componentes:

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.

#### Informe de Seguimiento del Proyecto:


De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:

Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD%	% Ejecución Financiera Acumulada	% Ejecución del Proyecto
I5137	I44,208,124.30	95,565,091.30	87,811,676.05	92%	61%

**NOTA:** El componente de Equipamiento se encuentra en proceso de licitación. El monto inicial del proyecto fue de RD\$ 128,418,382.22 pero el proyecto sufrió una reevaluación y aumento un total de RD\$ 15,789,742.08 lo cual representa un total de inversión del proyecto de RD\$ 144,208,124.30.

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A
		Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 5 de 15

- Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal – Código SNIP No. 15232.**

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inversión	Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos En Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal.	15232	150,852,898.42	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024

Nota: proyecto localidad Najayo Arriba.

**Objetivo del Proyecto:** Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 eco-viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de San Cristóbal, provincia San Cristóbal.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Producto:** Cantidad de Viviendas Construidas.

### Cronograma Físico del Proyecto

Fase	Producto	Meta	Fecha de Cumplimiento de la Meta
Inversión	Viviendas Construidas	50	2024

**Componentes:**

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 6 de 15

### Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:

Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD\$	% Ejecución Financiera Acumulada	% Ejecución del Proyecto
15232	150,852,898.42	95,565,091.30	89,950,818.08	94%	60%

**NOTA:** El componente de Equipamiento se encuentra en proceso de licitación. El monto inicial del proyecto fue de RD\$ 128,418,382.22 pero el proyecto sufrió una reevaluación y aumento un total de RD\$ 22,434,516.20 lo cual representa un total de inversión del proyecto de RD\$ 150,852,898.42.

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 7 de 15

- Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de Montecristi, Provincia Montecristi – Código SNIP No. I5129.**

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inversión	Construcción de Eco-Viviendas para Ciudadanos En Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de Montecristi, Provincia Montecristi.	I5129	173,567,534.72	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024

**Objetivo del Proyecto:** Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 eco-viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Montecristi, Provincia Montecristi.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Producto:** Cantidad de Viviendas Construidas.

#### Cronograma Físico del Proyecto

Fase	Producto	Meta	Fecha de Cumplimiento de la Meta
Inversión	Viviendas Construidas	50	2024

#### Componentes:

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 8 de 15

### Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:

Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD\$	% Ejecución Financiera Acumulada	% Ejecución del Proyecto
I5129	I73,567,534.72	I09,700,000.00	I01,816,853.70	93%	90%

**NOTA:** el componente de Equipamiento se encuentra en proceso de licitación. El monto inicial del proyecto fue de RD\$ I49,144,229.18 pero el proyecto sufrió una reevaluación y aumento un total de RD\$ 24,423,305.54 lo cual representa un total de inversión del proyecto de RD\$ I73,567,534.72.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución física acumulada:

Fase	Producto	Meta	Ejecución Meta Física	% de la Meta Física
Inversión	Viviendas Construidas	50	50	100%

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A
		Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 9 de 15

- Construcción de las Obras Complementarias de las Eco-Viviendas para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal – Código SNIP No. I5385.**

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inversión	Construcción de las Obras Complementarias de las Eco-Viviendas para Ciudadanos en Condición de Pobreza Multidimensional en el Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	I5385	54,930,052.92	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024

Nota: proyecto localidad Cañada Honda.

**Objetivo del Proyecto:** Este proyecto consiste en la construcción de cuarenta 40 eco-viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiará a ciento cuarenta (140) personas que representan cuarenta (40) familias.

**Producto:** Cantidad de Viviendas Construidas.

### Cronograma Físico del Proyecto

Fase	Producto	Meta	Fecha de Cumplimiento de la Meta
Inversión	Viviendas Construidas	40	2024



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 10 de 15

### Componentes:

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.

### Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:

Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD\$	% Ejecución Financiera Acumulada	% Ejecución del Proyecto
I5385	68,531,877.33	54,930,052.92	48,793,753.31	71%	71%


NOTA: el componente de Equipamiento se encuentra en proceso de licitación. El monto inicial del proyecto fue de 54,930,052.92 pero el contrato aumento un total de 13,601,824.41 lo cual representa un total de inversión de 68,531,877.33.

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.



**Anexos:**

- Barahona

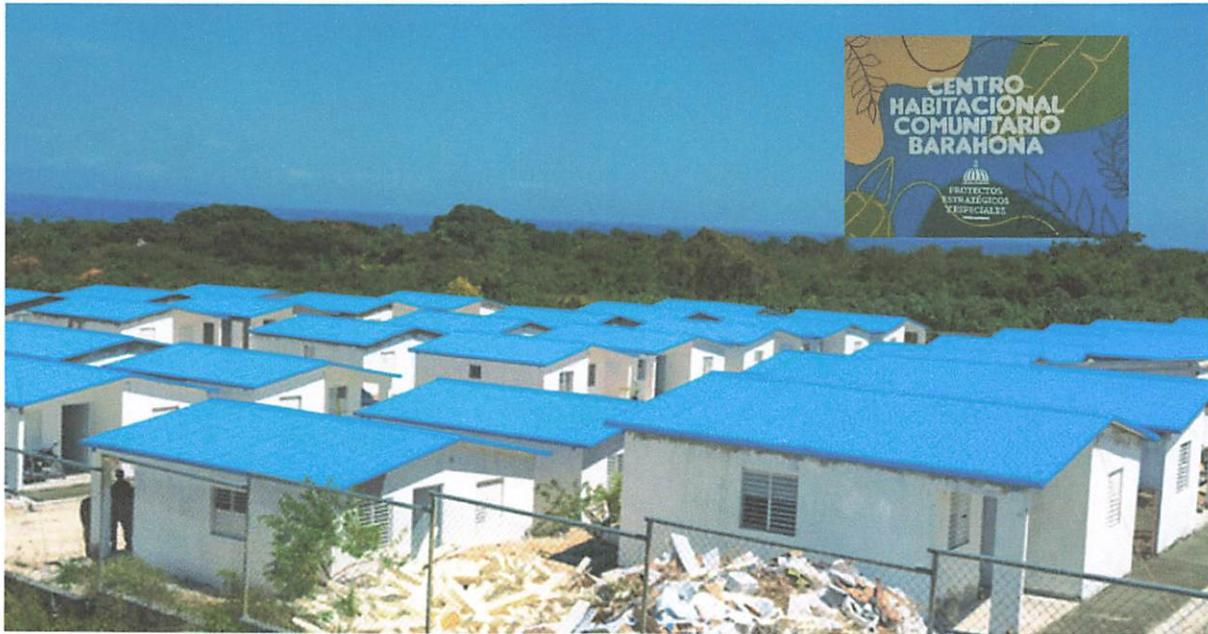

	<h1>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h1>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
<p>Informe Trimestral Ejecución de Proyecto</p>		<p>Página 12 de 15</p>

- Montecristi






- San Cristobal (Najayo Arriba)




DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  
 Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

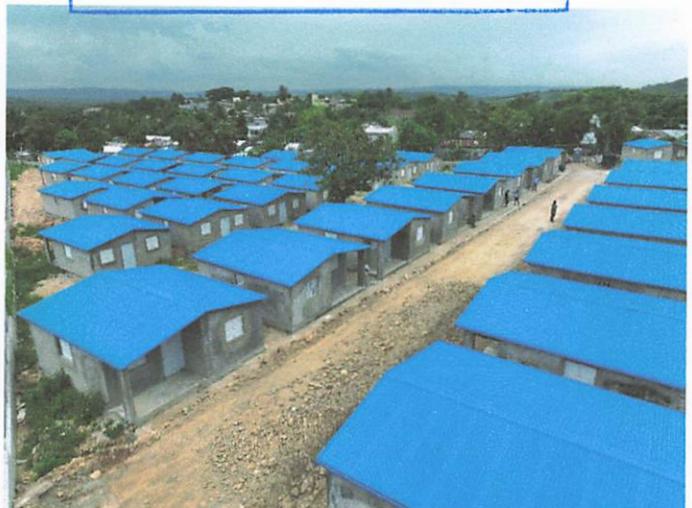

 <p>         PRESIDENCIA DE LA          REPÚBLICA DOMINICANA          Programas Especiales          PROPEEP       </p>	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe Trimestral Ejecución de Proyecto</p>	<p>Página 14 de 15</p>

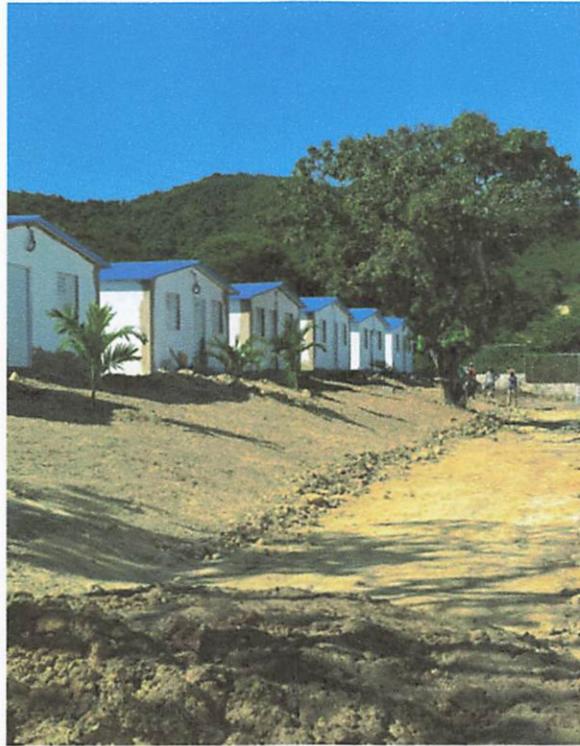

- San Cristóbal (Cañada Honda)



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 15 de 15

