



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto
T - 2

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 2 de 9



Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, dentro de la fuente de financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

El proyecto consiste en la Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter social, que busca reducir el déficit de cobertura de los servicios públicos en las localidades del territorio nacional, creando espacios y

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 3 de 9

oportunidades para fomentar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Este proyecto contempla la construcción de plazas comunitaria, en la que a su vez se instalarán una serie de servicios públicos considerados básicos y cuya oferta limitada o ausencia total castra de la posibilidad de desarrollo de una población de por si pobre y vulnerable. Con este proyecto se llevará bienestar a las personas que serán beneficiadas, los residuos que se generen en las plazas comunitaria serán clasificados y reciclados, también contará con una verja perimetral para brindar seguridad a los beneficiados.

- **Construcción de Plaza Comunitaria en el Municipio de Bánica, Provincia Elías Piña – Código SNIP No. I535I.**

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inversión	Construcción de Plaza Comunitaria en el Municipio de Bánica, Provincia Elías	I535I	61,837,690.99	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024

Objetivo del Proyecto: Este proyecto contempla la construcción de una plaza comunitaria donde se ofrezcan servicios básicos fundamentales en el municipio de Bánica.

Población Beneficiada: Se consideró objetivo a la población que reside en el territorio que pertenece a una subdivisión territorial en donde se desarrollará la intervención, que corresponde a un total de cinco mil seiscientos cuatro (5,604) personas.

Producto: Obras Civiles Construidas.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 4 de 9

Cronograma Físico del Proyecto

Fase	Producto	Meta	Fecha de Cumplimiento de la Meta
Inversión	Obras Civiles Construidas.	I	2024

Componentes:

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.
- Supervisión e Inspección de Obras.



Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:





Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física y Supervisión de la Obra RD%	Ejecución Acumulada RD%	% Ejecución Financiera Acumulada
I535I	61,837,690.99	55,694,107.79	36,442,897.32	59%



NOTA: solo se ha realizado el proceso de licitación de la obra física.

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 5 de 9

Anexos:

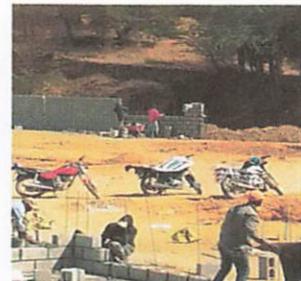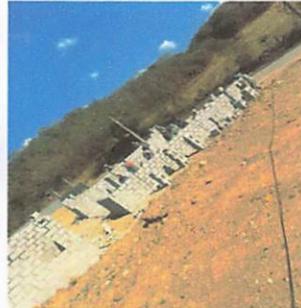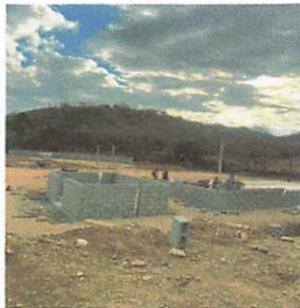
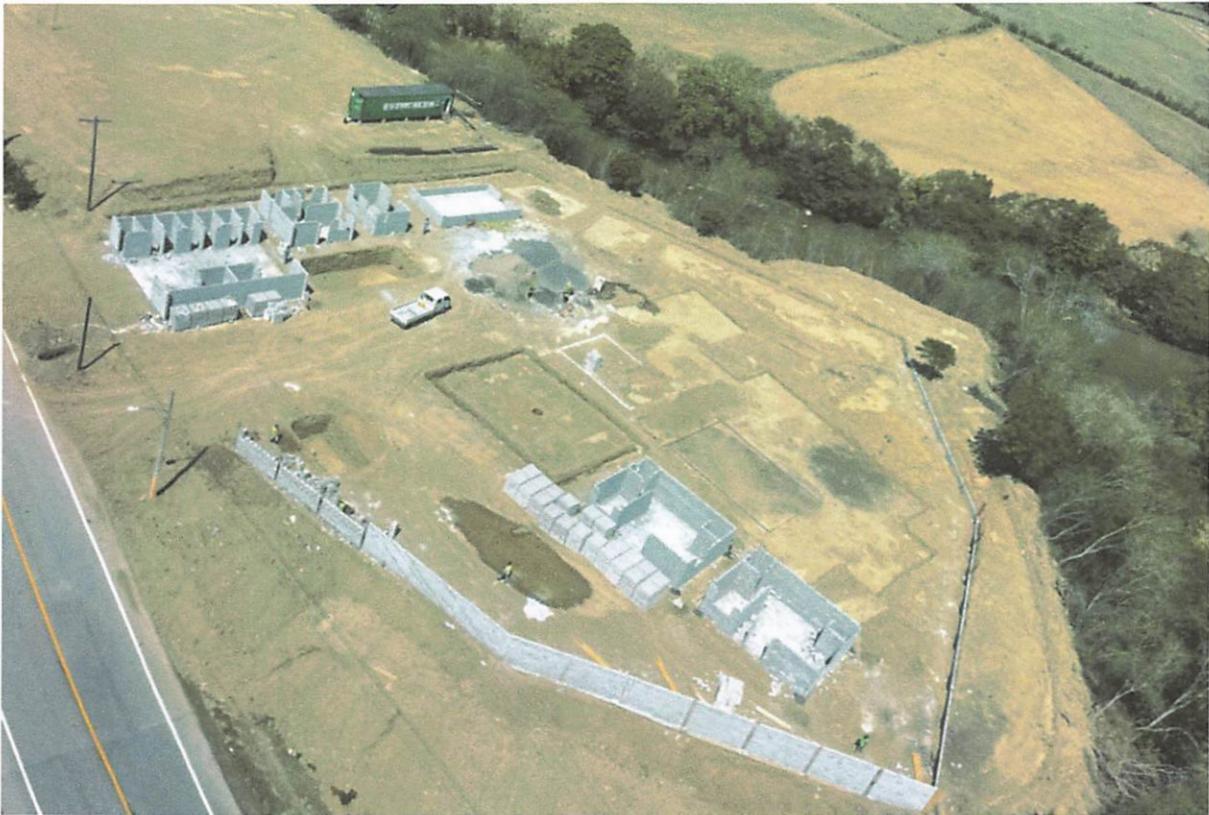


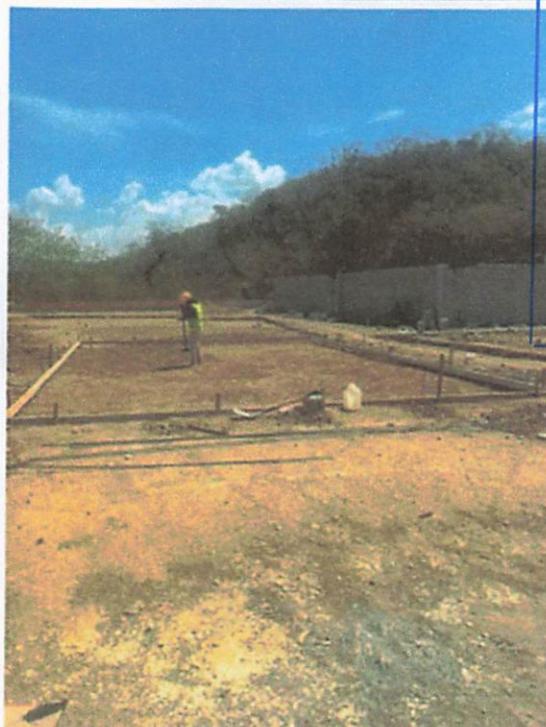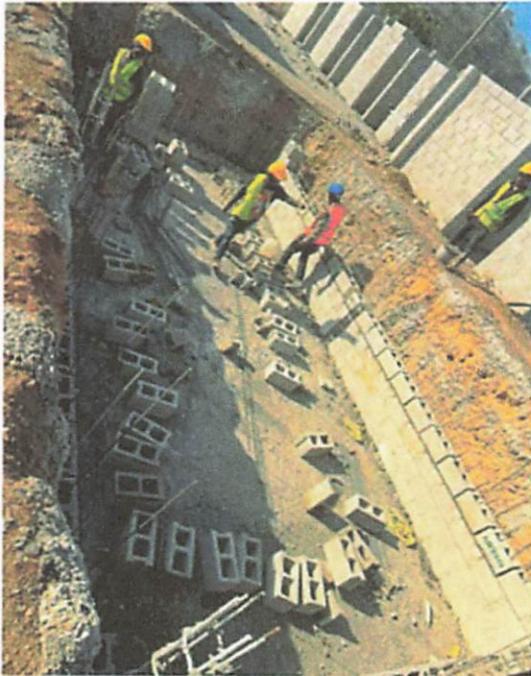

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

PROPEEP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO


RNC I

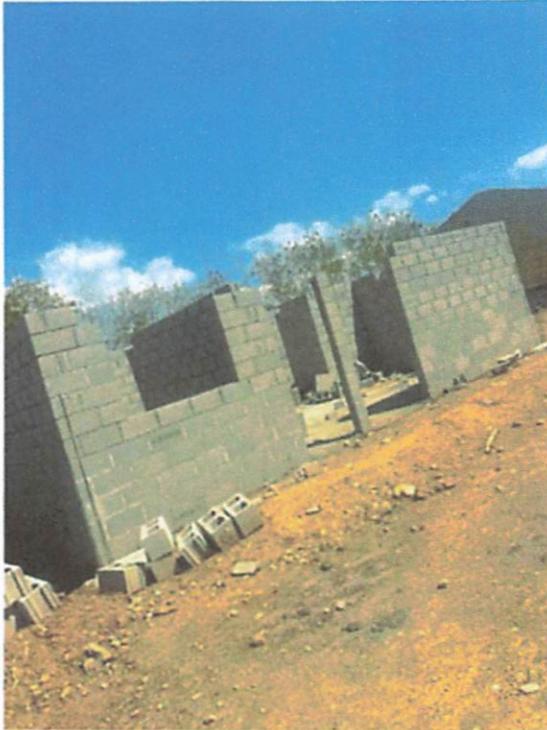

 <p> REPÚBLICA DOMINICANA Programas Especiales PROPEEP </p>	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	<p>Informe Trimestral Ejecución de Proyecto</p>	<p>Página 8 de 9</p>



DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 PROPEEP
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO


DIRECCION GENERAL
PROGRAMAS ESPECIALES

