



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto
T – IV
2025

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo,
DN, Edificio de Oficinas Gubernamentales
Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Sto. Dgo.



info@propeep.gob.do




www.propeep.gob.do



809 686 1800

 [propeepgob](https://www.facebook.com/propeepgob)

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 2 de 10




Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, con la fuente de financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

Los Proyectos de Eco - Hábitat consiste en la Construcción de infraestructuras sostenibles de carácter ecológico para el hábitat integral de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y en pobreza extrema en diferentes localidades del territorio nacional, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en familias viviendo

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A
		Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		Página 3 de 10

en condiciones de pobreza extrema, a través de un proyecto de construcción de Eco Hábitat o viviendas sostenibles, construidas con materiales que no dañan el medio ambiente, favoreciendo a las familias que se encuentran viviendo en condición de pobreza extrema.

- Construcción de Eco Hábitat Integral para familias en condición de vulnerabilidad en el Municipio de el Seibo, Provincia El Seibo – Código SNIP No. I5118.

Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inversión	Construcción de Eco Hábitat Integral para familias en condición de vulnerabilidad en el Municipio de el Seibo, Provincia El Seibo	I5118	150,971,224.91	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2026

Objetivo del Proyecto: Este proyecto consiste en la construcción de cincuenta 50 viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad en El municipio de el Seibo, Provincia El Seibo.


Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

Producto: Cantidad de Viviendas Construidas.

Cronograma Físico del Proyecto

Fase	Producto	Meta	Fecha de Cumplimiento de la Meta
Inversión	Viviendas Construidas	50	2026



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Página 4 de 10

Componentes:

- Obra Física.
- Equipamiento y Mobiliarios.


Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

En el caso de este Proyecto, está en su fase de ejecución y construcción de la Obra física, hasta el momento en este trimestre se destacan los siguientes avances:

- 47 plateas vaciadas con la instalación de las tuberías eléctricas y sanitarias. Las 3 plateas que están pendiente por vaciar se deben a que ese espacio será utilizado como vía de acceso para realizar la perforación del pozo filtrante.
- 7 registros sanitarios pendiente de reubicar.
- 23 viviendas con muros nuevos levantados las cuales cuentan con su instalación eléctrica y sanitaria (plomería instalada).

Además, cuenta con 3 vivienda con nuevos muros levantados, 5 viviendas completadas en la terminación de superficie, con cantos y mochetas, 2 viviendas completadas en la terminación de superficie, sin cantos y mochetas, 4 viviendas en proceso del pañete, 7 viviendas fraguachadas o revocadas para iniciar con el pañete y 2 viviendas solo con muros levantados (muros viejos)




A la fecha, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:



Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD%	% Ejecución Financiera Acumulada
15118	150,971,224.91	121,470,113.70	75,973,271.48	63%

NOTA: solo se ha realizado el proceso de licitación de la obra física.



El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en la Captura Física – Financiera de cada Trimestre, al igual que la reprogramación si aplica en cada caso.

Anexo:



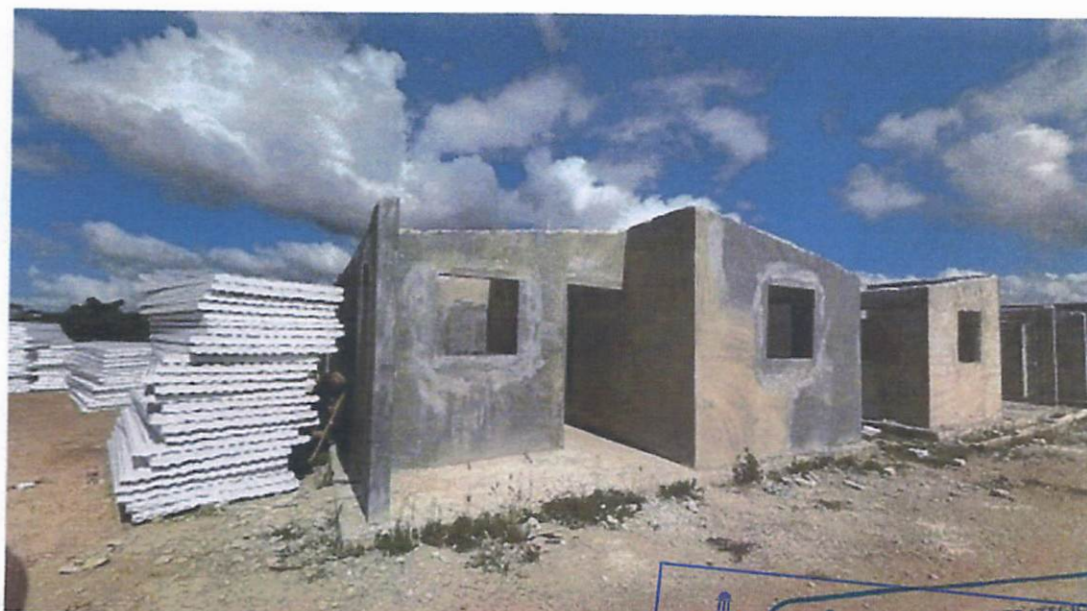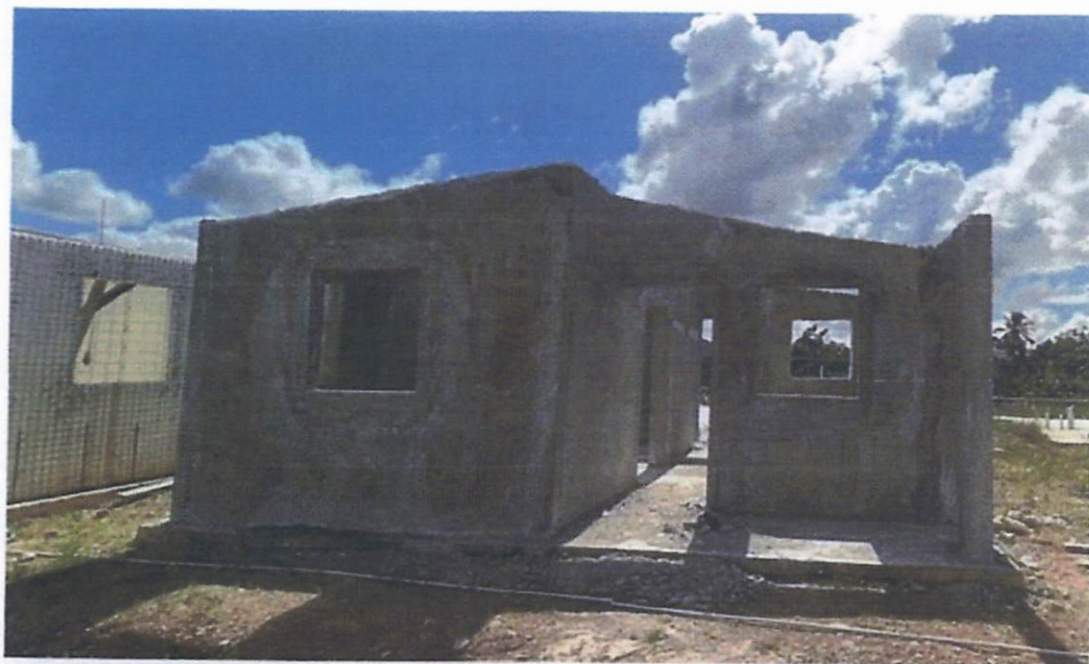



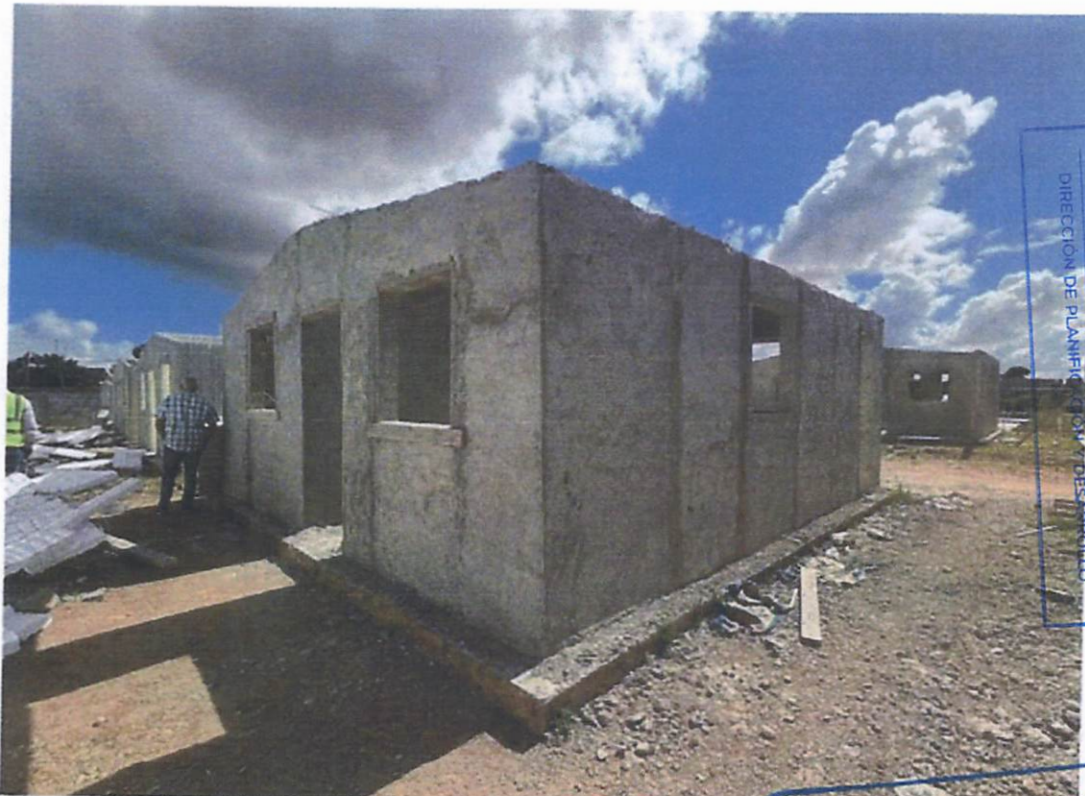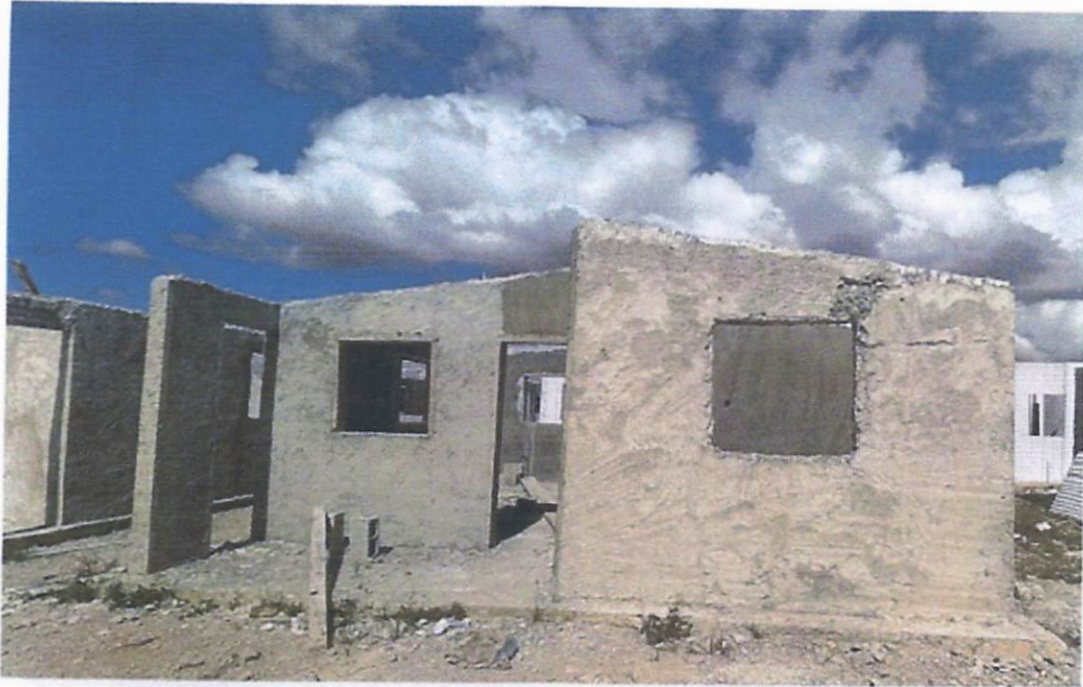

PROPEEP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA



