



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto T – I

Remozamiento e Intervención de La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional con el Proyecto Paseo de Los Colores.

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



Avenida Leopoldo Navarro, Santo Domingo,
D.N., Edificio de Oficinas gubernamentales
Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Sto. Dgo.



info@propeep.gob.do



www.propeep.gob.do



809.686.1800



propeepgob

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Fecha Actualización: N/A




Descripción de los Programas y Proyectos:

Dentro de la cartera de Programas y Proyectos formulados por el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia contempla una operación de Inversión Pública vigente bajo la sombrilla del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” que forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema en el territorio nacional.

El actual informe comprende de manera resumida el avance de la ejecución física – financiera de dicha operación que, con el financiamiento de Inversión Pública conforman la cartera de proyectos que complementan un nuevo modelo de gestión social, con enfoque de derecho sustentado en la coordinación y articulación de entidades del Estado y de la Sociedad. Sus iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.

Los Proyectos de “Paseo de los Colores” son proyectos de puesta en valor de la cultura dominicana a través del arte público y la revitalización de los territorios, con un enfoque sostenible de inclusión social y



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Fecha Actualización: N/A

participación comunitaria. Este proyecto de arte público vincula la participación comunitaria a través de actividades lúdicas, animación cultural y la construcción de paseos especiales.

Objetivo General: Impulsar el desarrollo cultural de los territorios a través del Arte público y la animación urbana que promuevan nuestra identidad cultural, tradiciones y patriotismo

- Remozamiento e Intervención del Paseo de Los Colores, La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional.


Fuente de Financiamiento	Nombre del proyecto	Código SNIP	Monto de Inversión	Estatus	Sector	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Fondo I04	Remozamiento e Intervención de La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional con el proyecto Paseo de Los Colores	N/A	46,882,128.66	En Ejecución	Vivienda y Servicios Comunitarios	2023	2024

Objetivo del Proyecto: Impulsar el desarrollo sociocultural de los moradores del sector Capotillo con iniciativas de construcción de infraestructura física, mejoras del entorno y realización de actividades de índole cultural.

Población Beneficiada: Este proyecto beneficiará a treinta y siete mil novecientos noventa y ocho (37,998) personas.

Componentes:

- Obra Física.
- Obra Artísticas.
- Capacitaciones.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe Trimestral Ejecución de Proyecto		

Informe de Seguimiento del Proyecto:

De acuerdo con la normativa del organismo financiador, se realizan informes de seguimiento trimestrales, en lo que se muestra el avance tanto físico como financiero. Estos se alimentan de los informes enviados por los ejecutores del proyecto, los cuales detallan el progreso a la fecha por cada componente bajo su responsabilidad.

A la fecha, a continuación, se refleja el porcentaje de ejecución financiera acumulada:


Código SNIP	Monto de Inversión RD\$	Monto del Contrato Componente Obra Física RD%	Ejecución Acumulada RD%	% Ejecución Financiera Acumulada
N/A	46,882,128.66	35,057,063.39	23,963,497.84	68%

El detalle de las informaciones de cada componente por auxiliar presupuestario está contenido en los reportes trimestrales remitidos desde el área de ejecución de obras.

Avance del Proyecto:

Obra Física /Infraestructura:

Se realizó el remozamiento del techo al Colegio Integrado Capotillo ubicado en la calle Respaldo Jose Martí #86 próximo al Centro Deportivo Capotillo (CDC), además de, se ha estado trabajando en la parte eléctrica del proyecto, se han instalado 13 transformadores, estructuras eléctricas, colocación de la mediana tensión (alambrado) y limpieza de estos en el tramo comprendido entre las calles 6 y calle La 42.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	Fecha Actualización: N/A

Obra Artística:


Al cierre del acuerdo de colaboración que teníamos con El Instituto Para El Desarrollo De Las Artes (INDARTE), que duró unos 12 meses y participaron junto a un coordinador profesores de canto coral, instrumentos de percusión, flauta dulce y danza, impactamos a 116 familias, con 179 clases impartidas a jóvenes y niños, las cuales pudimos contactar en las 22 visitas que le hicimos durante los 1 meses que se impartieron dichas clases. En conjunto con las clases se le donamos un total de 186 instrumentos musicales, t-shirt para los uniformes y presentación de los estudiantes, entrega de kit escolares para los estudiantes levantamientos socioeconómicos de las familias.

Componente Social:

Se realizó un proceso de Coordinación con el tejido social y las juntas de vecinos para realizar los diferentes trabajos de infraestructura que se realizaron en el eje de intervención, además desde la parte social se coordinó y llevó a cabo una reunión con los comerciantes de La Calle 42, en la que se consensuó su colaboración para el inicio de los trabajos de remozamientos inmediatamente después de la Semana Santa, ósea la semana del 21 de abril.

Componente Ambiental / Residuos Sólidos:

Se realizó la Entrega formal de 200 t-shirts y 200 gorras al personal administrativo, promotores, barredores, choferes y recolectores de residuos sólidos, con serigrafía alusiva a la intervención. Entrega de brochures informativos y educativos los cuales están siendo distribuidos en Capotillo como parte de las labores educativas a la comunidad sobre residuos sólidos, y para la publicidad rotulación de un camión recolector, de dos carritos recolectores de residuos sólidos y stickers para ser colocados en los hogares y negocios que estén dentro del eje de intervención.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	

La Recolección de residuos sólidos en el eje de intervención: en el mes de enero se recolectaron 179,290 toneladas en febrero 189,440 toneladas y en marzo 185,670 toneladas, en cuanto a las actividades de barridas se llevaron a cabo 60, 60 y 52 por mes respectivamente y en todas múltiples jornadas de limpiezas en los alrededores del Mercado Nuevo y en cada uno de los meses se realizaron jornadas de fumigación casa por casa en todo el eje de intervención.

La Fundación ESCOBA a fin de poder concluir con el cronograma de trabajo que se han planteado para cumplir con los objetivos del proyecto van a extender los trabajos hasta el 30 de mayo.

Anexos:


Infraestructura





Informe Trimestral Ejecución de Proyecto



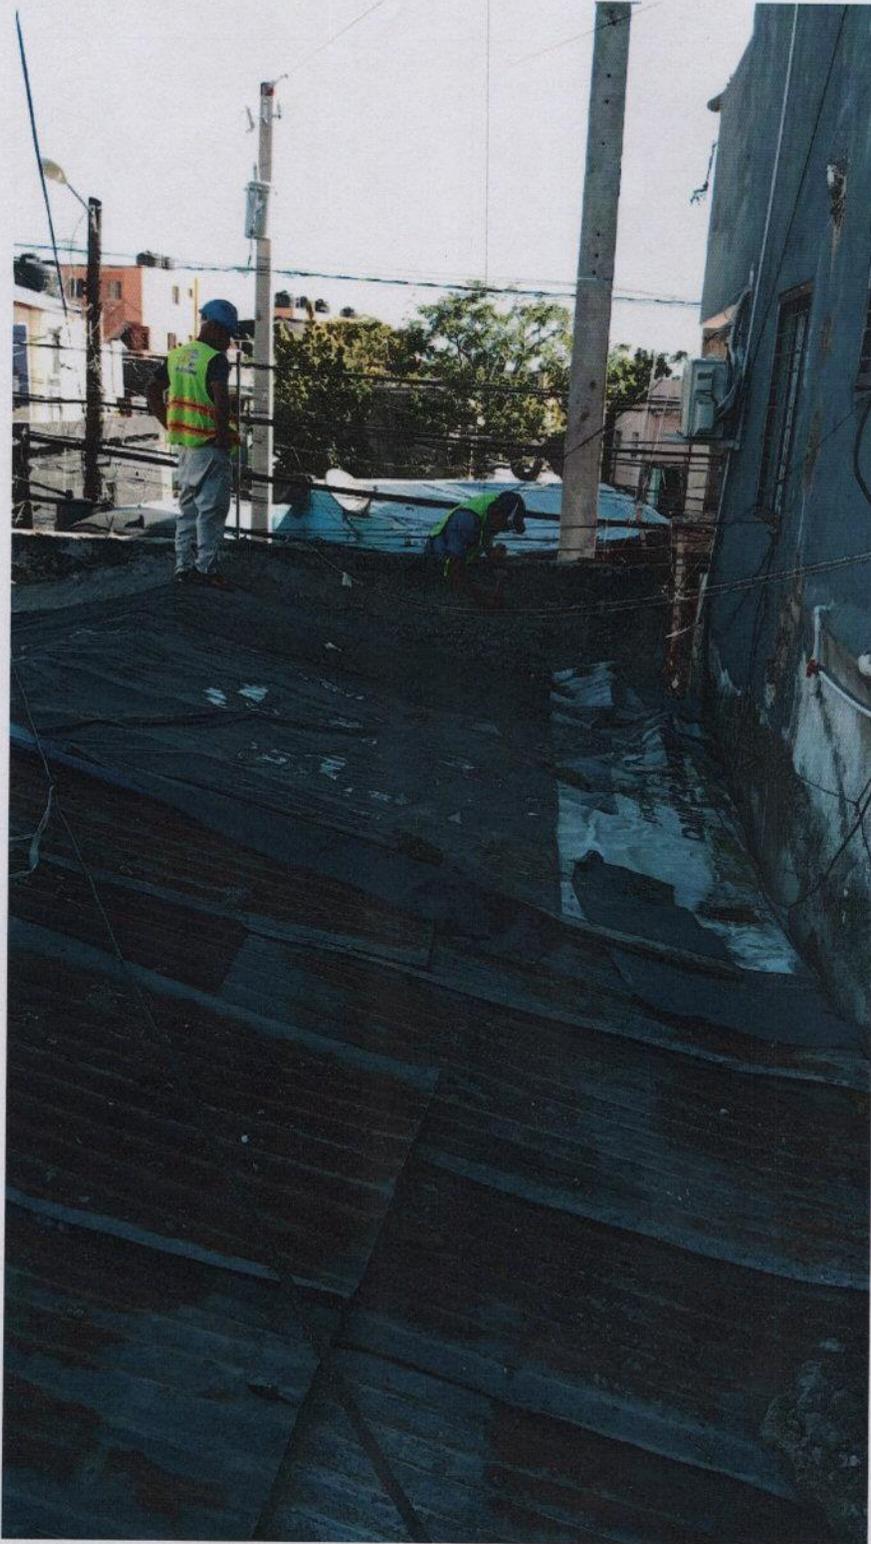

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	




DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	<p align="center">PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
<p align="center">Informe Trimestral Ejecución de Proyecto</p>		

Social



Informe Trimestral Ejecución de Proyecto



Informe Trimestral Ejecución de Proyecto



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe Trimestral Ejecución de Proyecto	




**DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
 Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Informe Trimestral Ejecución de Proyecto

