



PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia  
(PROPEEP)

Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución  
Año 2023



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  
Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



Avenida Leopoldo Navarro, Santo Domingo,  
D.N., Edificio de Oficinas Gubernamentales,  
Juan Pablo Duarte, 6to Piso, Sto. Dgo.



[info@propeep.gob.do](mailto:info@propeep.gob.do)



[www.propeep.gob.do](http://www.propeep.gob.do)



809.686.1800

[propeep.gob.do](https://www.propeep.gob.do)

## CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III.	ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	6
IV.	NIVEL DE EJECUCION DEL LOS PROYECTOS EN ESTATUS DE EJECUCION.....	7
4.1	CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA – SNIP 15137....	7
4.2	CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL– SNIP 15232 .....	8
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI – SNIP 151299	
4.4	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL – SNIP 15385.....	10
4.5	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA – SNIP 15351 .....	11
4.6	CONSTRUCCIÓN DE ECO-HÁBITAT INTEGRAL PARA FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO – SNIP 15118.....	12
4.7	REMOZAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL PASEO DE LOS COLORES, LA CALLE 42, CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL.....	13
4.8	RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ALUZINC CON MADERA DE PINO TRATADO, REMOCIÓN DE TECHOS EXISTENTES Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL .....	14
4.8.1	REMOZAMIENTO DE QUINCE (15) TECHOS DE ZINC EN SAN CRISTÓBAL .....	14
4.9	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.....	15
	FOTONETRIA DE LA ULTIMA VISITA DE INFRAESTRUCTURA .....	16
	BARAHONA SNIP 15137 .....	16
	BANICA SNIP 15351 .....	17
	SAN CRISTOBAL SNIP 15232 Y 15385.....	18
	MONTE CRISTI SNIP 15129 .....	21




	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	Página 3 de 21

## I. INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPPE), es una entidad gubernamental que contribuye al logro de las Metas Presidenciales de reducción de la pobreza y la exclusión social. PROPEEP en su interés de dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el decreto que la crea, las demandas y retos que se establecen en la realidad del Estado dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno, busca la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales que en conjunto fortalecen los Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas.

PROPEEP en cumplimiento con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), quien tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema, entré estos, se destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es signataria.



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	Página 4 de 21

## II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

### Misión

Somos una entidad gubernamental especializada en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas con enfoque multisectorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y al desarrollo territorial sostenible.

### Visión

Ser un modelo de articulación interinstitucional que promueve la creación de iniciativas innovadoras y sostenibles, que impulsen la igualdad de oportunidades en las comunidades, buscando contribuir a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.

### Valores

- Responsabilidad
- Equidad
- Integridad
- Respeto

### Base Legal

La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), fue creada mediante el Decreto 491-12, de fecha 21 de agosto de 2012, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derecho, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos se creó la Estrategia Quisqueya sin Miseria, con tres componentes básicos: Plan Nacional de Alfabetización, “Quisqueya Aprende Contigo” (QAC); Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “Quisqueya Empieza Contigo” (QEC) y Plan Nacional de Desarrollo Local Integral “Quisqueya Somos Todos” (QST), reestructurado en 2017 como Quisqueya Digna (QD).



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 5 de 21</b>

El Decreto 546-12, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).


El Decreto 102-13, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan “Quisqueya Empieza Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y conforma la Comisión Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP.

Adicionalmente, el Decreto 260-14, de fecha 23 de julio de 2014, declara de alta prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la cuenca alta, media y baja de los ríos Ozama e Isabela, así como el desarrollo integral de asentamientos humanos circundantes, crea la Comisión Presidencial para tales fines y designa a DIGEPEP como integrante de la Dirección Ejecutiva.

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 491-12 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el Ministro sin Cartera José Leonel Cabrera –ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020– queda designado como Ministro encargado de la Institución.

Mediante el Decreto 62-21, el presidente, Luis Abinader Corona puso a cargo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), la intervención de los vertederos a cielo abierto de Haina, Puerto Plata, Punta Cana, Higüey, Samaná, Nagua, Las Terrenas y Santo Domingo Este, con la finalidad de que éstos sean remediados y construir estaciones de transferencia en los mismos.

Mediante el decreto 15-23, el señor Roberto Ángel Salcedo Sanz queda designado Director General de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	Página 6 de 21

Mediante el decreto 28-23, se crea la Unidad Ejecutora (ECO5RD), bajo esta Unidad se efectuarán las actividades para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto 62-12 del 5 de febrero de 2021.

Mediante el decreto 341-23, de fecha 31 de julio de 2023 se dispone la transferencia del Plan Nacional de Alfabetización (Quisqueya Aprende Contigo) y todos los recursos vinculados al mismo, desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) hacia el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

### III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectuar el proceso de evaluación de los Proyectos en Ejecución, la Dirección de Planificación y Desarrollo realizó la solicitud a las diferentes áreas que generan los resultados institucionales del reporte de ejecución, a los fines de realizar la evaluación del alcance de las metas y los productos entregados. Los reportes presentados en el siguiente informe fueron consolidados y evaluados realizando una comparación de lo planificado versus lo ejecutado, para el cálculo se consideró el monto programado por contrato, utilizando el siguiente método de cálculo:

- **% de ejecución del trimestre** = (ejecutado / programado) x 100

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación.

TABLA A: Rango de semaforización

	RANGO	DESCRIPCIÓN
	≥90%	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥80% - ≤89%	Ejecución suficiente
	≥60% - ≤79%	Ejecución mínima
	≥0% - ≤59%	Ejecución insuficiente con relación a la programación



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 7 de 21</b>

#### IV. NIVEL DE EJECUCION DEL LOS PROYECTOS EN ESTATUS DE EJECUCION.

##### 4.1 CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA – SNIP 15137

Etapa Actual	<b>Ejecución</b>
Sector	<b>Vivienda y Servicios Comunitarios</b>
Fecha de Inicio	<b>2023</b>
Fecha de Finalización	<b>2024</b>
Código SNIP	<b>15137</b>
Ejecutor primario <b>DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (PROPEEP).</b>	

**Objetivo General del Proyecto:** Este proyecto consiste en la construcción de 50 eco-viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Barahona, Provincia Barahona.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$128,418,382.22

**Monto del Contrato Obra Fisica:** RD\$ 95,565,091.30


**No. De Contrato:** QST-2022-00029

**No. De Certificación de Contrato:** CO-0002009-2022

**Contratista:** Constructora Casolar, SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 83,269,220.67

**Porcentaje de Ejecución:** 87%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	Página 8 de 21

#### 4.2 CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL– SNIP 15232

Etapa Actual	<b>Ejecución</b>
Sector	<b>Vivienda y Servicios Comunitarios</b>
Fecha de Inicio	<b>2023</b>
Fecha de Finalización	<b>2024</b>
Código SNIP	<b>15232</b>

Ejecutor primario  
**DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (PROPEEP).**

**Objetivo General del Proyecto:** La presente iniciativa pretende dar solución a la necesidad de mejorar las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las familias en pobreza extrema que caracteriza la población impactada en esta demarcación territorial y que se verán beneficiadas con la entrega de 50 viviendas ecológicas, con sus servicios básicos como agua potable, luz y sistema sanitario.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$128,418,382.22

**Monto del Contrato Obra Fisica:** rd\$ 95,565,091.30

**No. De Contrato:** QST-2022-00029

**No. De Certificación de Contrato:** CO-0002009-2022

**Contratista:** Constructora Casolar, SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 86,462,292.02

**Porcentaje de Ejecución:** 90%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 9 de 21</b>

### 4.3 CONSTRUCCIÓN DE ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO MONTE CRISTI, PROVINCIA MONTE CRISTI – SNIP 15129

Etapa Actual	<b>Ejecución</b>
Sector	<b>Vivienda y Servicios Comunitarios</b>
Fecha de Inicio	<b>2023</b>
Fecha de Finalización	<b>2024</b>
Código SNIP	<b>15129</b>

Ejecutor primario  
**DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (PROPEEP).**

**Objetivo General del Proyecto:** Este proyecto integral contempla la construcción de 50 viviendas de carácter ecológico por lotes en el municipio de Monte Cristi que vendrán a paliar y contribuir con la disminución del déficit habitacional que afecta a todo el territorio nacional y de manera específica a este municipio con lo que se elevará el nivel de vida y el bienestar de las personas que serán beneficiadas. Estas viviendas constan de espacios especializados para la recreación y esparcimiento, servicios básicos como energía eléctrica suplica por paneles fotovoltaicos, instalaciones sanitarias, vías de acceso y verja perimetral.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$ 149,144,229.18

**Monto del Contrato Obra Física:** RD\$ 109,700,000.00


**No. De Contrato:** QST-2022-00056

**No. De Certificación de Contrato:** CO-0002014-2022

**Contratista:** Agresp Ingeniería & Asociados, SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 71,482,973.79

**Porcentaje de Ejecución:** 65%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: N/A  Versión: N/A  Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023	Página 10 de 21

#### 4.4 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS ECO-VIVIENDAS PARA CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL – SNIP 15385

Etapa Actual	Ejecución
Sector	Vivienda y Servicios Comunitarios
Fecha de Inicio	2023
Fecha de Finalización	2023
Código SNIP	15385

Ejecutor primario  
**DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  
 Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 (PROPEEP).**

**Objetivo General del Proyecto:** Estas obras complementarias, están llamadas a llenar un conjunto de necesidades que elevarán la calidad y utilidad de un proyecto de carácter ecológico, que procura garantizar la sostenibilidad ambiental no limitándose únicamente al tradicional concepto de “techo”, sino que apunta a intervenir y velar por las condiciones generales que guarden el bienestar de los beneficiarios y su entorno, asegurando que sean apropiadas para el desarrollo de todos los integrantes de la familia, brindando oportunidades de una nueva forma de vivir a los beneficiados. Conlleva la construcción de áreas verdes para el disfrute de las familias, solución de agua potable, solución de drenaje sanitario, sistema eléctrico, vías de comunicación y verja perimetral.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiara a las ciento cuarenta (140) personas que representan Cuarenta (40) familias del proyecto SNIP 15232.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$54,930,052.92


**Costo Total de Adicionales:** RD\$ 13,601,824.41

**Costo total con los adicionales:** RD\$ 68,531,877.33

**Contratista:** Balcam Projects, SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 48,793,753.31

**Porcentaje de Ejecución:** 71%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 11 de 21</b>

#### 4.5 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA – SNIP 15351

**Objetivo General del Proyecto:** Este proyecto contempla la construcción de una plaza comunitaria donde se ofrezcan servicios básicos fundamentales en el municipio de Bánica.

**Población Beneficiada:** Se consideró objetivo a la población que reside en el territorio que pertenece a una subdivisión territorial en donde se desarrollará la intervención, que corresponde a un total de 5,604 personas.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$ 61,837,690.99

**Monto del Contrato Obra Física:** RD\$ 55,694,107.79

**No. De Contrato:** QST-2023-00045

**No. De Certificación de Contrato:** CO-0001852-2023

**Contratista:** Constructora Cruz Muñoz

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 26,558,820.90

**Porcentaje de Ejecución:** 43%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 12 de 21</b>

#### 4.6 CONSTRUCCIÓN DE ECO-HÁBITAT INTEGRAL PARA FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO – SNIP 15118

**Objetivo General del Proyecto:** Este proyecto integral contempla la construcción de 50 viviendas de carácter ecológico por lotes en el municipio de El Seibo, provincia del El Seibo que vendrán a palear y contribuir con la disminución del déficit habitacional que afecta a todo el territorio nacional y de manera específica a este municipio con lo que se elevará el nivel de vida y el bienestar de las personas que serán beneficiadas.

**Población Beneficiada:** Este proyecto beneficiara a ciento setenta y cinco (175) personas que representan cincuenta (50) familias.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$ 150,971,224.91

**Monto del Contrato Obra Física:** RD\$ 121,470,113.70


**No. De Contrato:** QST-2023-00171

**No. De Certificación de Contrato:** CO-0003093-2023

**Contratista:** Constructora Rempart, SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 24,294,022.74

**Porcentaje de Ejecución:** 20%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 13 de 21</b>

#### 4.7 REMOZAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL PASEO DE LOS COLORES, LA CALLE 42, CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL

**Objetivo General del Proyecto:** Impulsar el desarrollo sociocultural de los moradores del sector de Capotillo con iniciativas de construcción de infraestructura física, mejoras del entorno y realización de actividades de índole cultural.

**Población Beneficiada:** 37,998 personas.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$ 46,882,128.66

**Monto del Contrato Obra Física:** RD\$ 35,057,063.39

**No. De Contrato:** QST-2023-00072

**No. De Certificación de Contrato:** CO-0001986-2023

**Contratista:** Constructora Irgonza SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 7,011,412.08

**Porcentaje de Ejecución:** 20%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 14 de 21</b>

#### 4.8 RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ALUZINC CON MADERA DE PINO TRATADO, REMOCIÓN DE TECHOS EXISTENTES Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL

**Objetivo General del Proyecto:** Reconstrucción de techos en Aluzinc con madera de pino tratado, remoción de techos existentes y bote en comunidades y sectores vulnerables a nivel nacional.

**Población Beneficiada:**

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$ 47,755,077.32

**Monto del Contrato Obra Física:** RD\$ 47,755,077.32

**Monto Adenda:** RD\$ 11,993,993.74

**Monto del contrato con adenda:** RD\$ 59,689,070.76

**No. De Contrato:** QST-2022-00066

**No. De Certificación de Contrato:** CO-0002826-2022

**Contratista:** Afa Servicios, SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 53,392,237.35

**Porcentaje de Ejecución:** 89%

##### 4.8.1 REMOZAMIENTO DE QUINCE (15) TECHOS DE ZINC EN SAN CRISTÓBAL

**Objetivo General del Proyecto:** Remozamiento de 15 techos de zinc en san Cristóbal

**Población Beneficiada:** quince (15) familias.

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$ 2,999,578.06

**Monto del Contrato Obra Física:** RD\$ 2,999,578.06

**No. De Contrato:**

**No. De Certificación de Contrato:**

**Contratista:** Afa Servicios, SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 2,593,752.79

**Porcentaje de Ejecución:** 89%



	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión: N/A</b>  <b>Versión: N/A</b>  <b>Fecha Actualización: N/A</b>
	<b>Informe de Monitoreo y Avances de los Proyectos en Ejecución 2023</b>	<b>Página 15 de 21</b>

#### 4.9 INSTRUCCIÓN DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

**Objetivo General del Proyecto:** Remozamiento de techos de zinc y viviendas unifamiliares.

**Población Beneficiada:**

**Costo Total del Proyecto:** El costo de inversión estimado del proyecto es de RD\$ 36,000,000.00

**Monto del Contrato Obra Física:** RD\$ 36,000,000.00


**No. De Contrato:**

**No. De Certificación de Contrato:**

**Contratista:** Constructora REMPART SRL

**Ejecución del Contrato:** RD\$ 7,200,000.00

**Porcentaje de Ejecución:** 20%



**V - FOTOMETRIA DE LA ULTIMA VISITA DE INFRAESTRUCTURA.**



**BARAHONA SNIP 15137**




**BANICA SNIP 15351**





**SAN CRISTOBAL SNIP 15232 Y 15385**

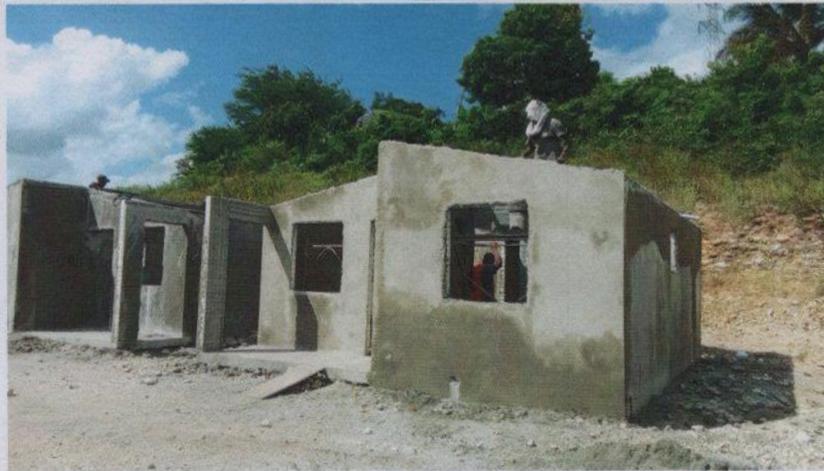





### MONTE CRISTI SNIP 15129

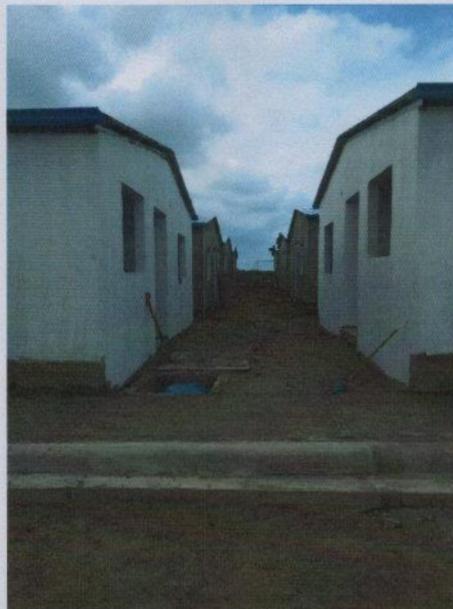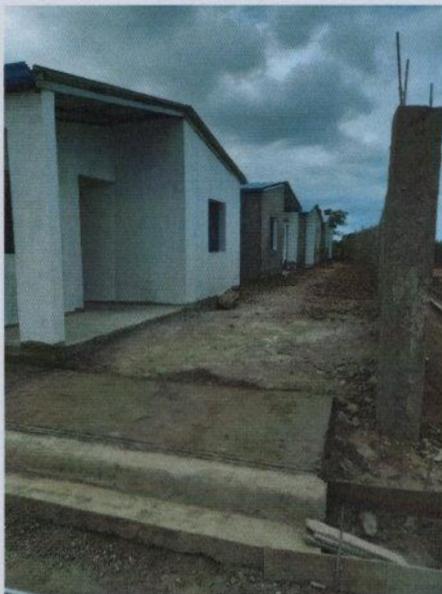

DIRECCION DE APLICACION Y DESARROLLO  
DIRECCION GENERAL  
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  
Y ESPECIALIZADOS DE LA FUNDACION
